Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	Dränagearbeiten	5,5 Tage?	Di 09.06.09	Di 16.06.09	
2	Stahlbetonarbeiten	1 Tag?	Di 16.06.09	Mi 17.06.09	1
3	Abdichtungsarbeiten	1 Tag?	Mi 17.06.09	Do 18.06.09	2
4	Maurerarbeiten	6,69 Tage?	Do 18.06.09	Mo 29.06.09	3
5	Stahlbetonarbeiten	1 Tag?	Mo 29.06.09	Di 30.06.09	4
6	Fliesenarbeiten	0,13 Tage?	Mi 22.07.09	Mi 22.07.09	42
7	Estricharbeiten	3,69 Tage?	Do 23.07.09	Di 28.07.09	33
8	Tischlerarbeiten, Fenster	1,06 Tage?	Do 23.07.09	Fr 24.07.09	33
9	Malerarbeiten	6,06 Tage?	Fr 21.08.09	Mo 31.08.09	36
10	Gebäudereinigung	0,5 Tage?	Do 17.09.09	Do 17.09.09	38
11	Maurerarbeiten	1 Tag?	Di 30.06.09	Mi 01.07.09	5
12	Stahlbetonarbeiten	1 Tag?	Mi 01.07.09	Do 02.07.09	11
13	Betonwerksteinarbeiten	0,19 Tage?	Mi 16.09.09	Mi 16.09.09	29
14	Putzarbeiten	5,88 Tage?	Mi 22.07.09	Mi 29.07.09	42
15	Fliesenarbeiten	3,88 Tage?	Mi 29.07.09	Di 04.08.09	14
16	Estricharbeiten	4,81 Tage?	Di 28.07.09	Di 04.08.09	7
17	Tischlerarbeiten, Fenster	3,38 Tage?	Di 18.08.09	Fr 21.08.09	35
18	Malerarbeiten	5,31 Tage?	Mo 31.08.09	Mo 07.09.09	19
19	Tapezierarbeiten	5,81 Tage?	Fr 21.08.09	Mo 31.08.09	36
20	Gebäudereinigung	0,38 Tage?	Do 17.09.09	Do 17.09.09	38
21	Maurerarbeiten	3,66 Tage?	Do 02.07.09	Di 07.07.09	12
22	Stahlbetonarbeiten	1 Tag?	Di 07.07.09	Mi 08.07.09	21
23	Betonwerksteinarbeiten	0,19 Tage?	Mi 16.09.09	Mi 16.09.09	29
24	Putzarbeiten	6,44 Tage?	Mi 22.07.09	Do 30.07.09	42
25	Fliesenarbeiten	4,13 Tage?	Fr 21.08.09	Do 27.08.09	36
26	Estricharbeiten	4,81 Tage?	Di 04.08.09	Di 11.08.09	16
27	Tischlerarbeiten, Fenster	2,69 Tage?	Di 18.08.09	Do 20.08.09	35
28	Malerarbeiten	5,75 Tage?	Mo 31.08.09	Mo 07.09.09	19
29	Tapezierarbeiten	6,38 Tage?	Mo 07.09.09	Mi 16.09.09	28
30	Gebäudereinigung	0,38 Tage?	Do 17.09.09	Do 17.09.09	38
31	Maurerarbeiten	1 Tag?	Mi 08.07.09	Do 09.07.09	22
32	Betonwerksteinarbeiten	0,09 Tage?	Do 09.07.09	Do 09.07.09	31
33	Putzarbeiten	1 Tag?	Mi 22.07.09	Do 23.07.09	42
34	Fliesenarbeiten	4,13 Tage?	Di 11.08.09	Mo 17.08.09	26
35	Estricharbeiten	4,81 Tage?	Di 11.08.09	Di 18.08.09	26
36	Tischlerarbeiten, Fenster	3,06 Tage?	Di 18.08.09	Fr 21.08.09	35
37	Malerarbeiten	1 Tag?	Mi 16.09.09	Do 17.09.09	29
38	Tapezierarbeiten	1 Tag?	Mi 16.09.09	Do 17.09.09	29
39	Gebäudereinigung	0,38 Tage?	Do 17.09.09	Do 17.09.09	30
40	Stahlbetonarbeiten	1 Tag?	Do 09.07.09	Fr 10.07.09	32
41	Zimmerarbeiten	2 Tage?	Fr 10.07.09	Di 14.07.09	40
42	Dachdeckerarbeiten	5,09 Tage?	Di 14.07.09	Mi 22.07.09	41

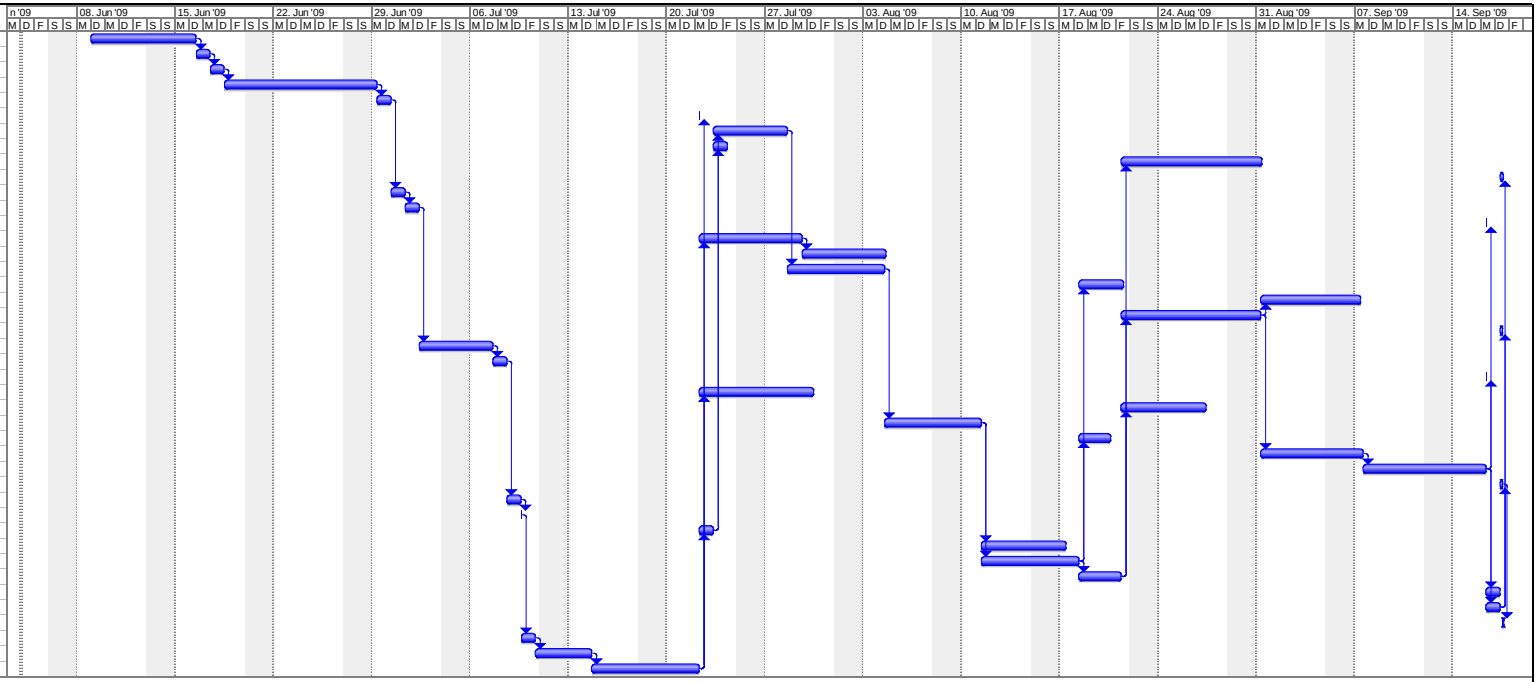

Projekt: Projekt1
Datum: Do 04.06.09

Vorgang | In Arbeit | Sammelvorgang | Externe Vorgänge | Stichtag
Unterbrechung | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Externer Meilenstein
